


【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 ◆A-4-1-1 事業名 多賀城史遊館改修事業
事業費 総額 35,460 千円 (内訳：設計費 1,590 千円、工事費 33,870 千円)
事業期間 平成 24 年度～平成 25 年度

事業目的・事業地区
被災者の早期居住再建を目指して、新築住宅建設等に伴い必要となる埋蔵文化財包蔵地における発掘調査を行うが、出土した文化財資料を適切に整理・保管するため、多賀城史遊館の収蔵庫をの改修を行ったもの。

位置図

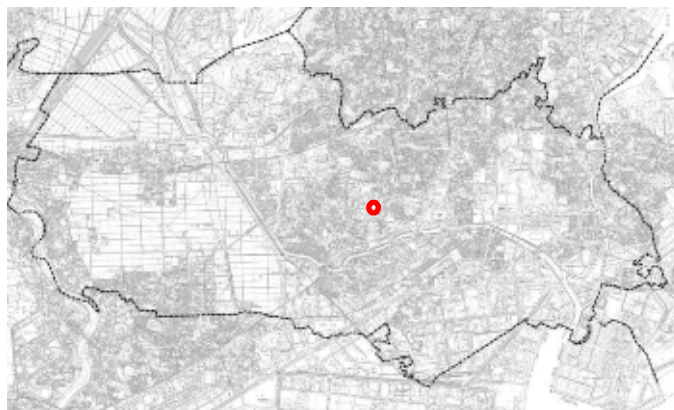

事業結果
施設名：多賀城史遊館（改修面積 460 m²）

施工前



施工後



<平成 24 年度>

・設計 1,590 千円

<平成 25 年度>

・工事 33,870 千円

事業の実績に関する評価

①事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

・本計画に基づき収蔵庫の改修を実施したことにより、収容可能箱数 7,000 箱から 1,800 箱増加し、8,800 箱となった。増加した 1,800 箱に震災関連調査出土遺物を収容することにより、基幹事業（A-4-1 埋蔵文化財発掘調査事業）の発掘調査がより円滑に進捗した。

②コストに関する調査・分析・評価

・事業費の設計・積算は、公共建築工事積算基準書等により実施し、多賀城市契約規則等に基づき契約を行い、業者を選定している。
・また、コストについては比較できる直近の同種他事業が無いため分析は困難であるが、工事費については、経済性や施工性などを総合的に判断し、改修工法を決定した。

③事業手法に関する調査・分析・評価

・本事業は、以下のとおり、概ね予定どおり事業を進めることができた。

<想定した事業期間>

設計 入札手続き・発注・完了 平成 24 年 4 月～平成 25 年 3 月

工事 入札手続き・発注・完了 平成 25 年 4 月～平成 26 年 3 月

<実際に事業に要した事業期間>

設計 入札手続き・発注・完了 平成 24 年 6 月～平成 24 年 11 月

工事 入札手続き・発注・完了 平成 25 年 4 月～平成 26 年 2 月

・改修工事の施工については、施工性・効率性等を考慮した工法を採用した結果、円滑に工事を進めることができ、予定どおり工事が完了した。

事業担当部局

教育委員会事務局文化財課 電話番号：022-368-1141
