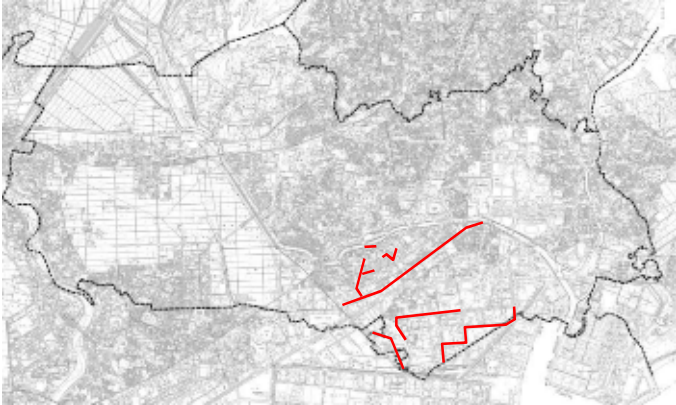


【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 D-21-1 事業名 下水道事業(雨水整備)
事業費 総額 5,269,437 千円 (内訳: 本工事費 4,783,064 千円、調査設計費 99,868 千円、 補償費 386,505 千円)
事業期間 平成 24 年度～平成 31 年度
事業目的・事業地区 東日本大震災の地震による地盤沈下及び津波被害を踏まえ、内水排除困難区域(八幡、桜木、栄、明月、宮内及び大代地区)における排水機能の向上、衛生的な生活環境・企業経営環境の再生を目指して、雨水幹線等の整備を行う。
位置図 
事業結果 路線名: 宮内雨水幹線、明月雨水幹線、八幡雨水幹線、町前雨水幹線、八幡雨水枝線、大代雨水枝線 <平成 24 年度～平成 29 年度> ・ 調査設計 99,868 千円 <平成 25 年度～平成 31 年度> ・ 本工事 4,783,064 千円 <平成 26 年度～平成 31 年度> ・ 物件移転補償 386,505 千円
事業の実績に関する評価 ①事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 ・ 本計画に基づき 10 年に 1 回程度発生が想定される大雨に対応するための排水路が整備されたことから事業が適正に執行されていると判断される。 ②コストに関する調査・分析・評価 ・ 事業費の設計・積算は、基準書等により実施し、多賀城市契約規則等に基づき契約を行い、業者を選定している。 ・ また、コストについては比較できる直近の同種他事業が無いため分析は困難であ

るが、工事費については、経済性や施工性などを総合的に判断し、水路形式等を決定した。

③事業手法に関する調査・分析・評価

・本事業は、以下のとおり、事業を進めることができた。

<想定した事業期間>

調査設計	入札手続き・発注・完了	平成 25 年 1 月～平成 27 年 9 月
補償	完了	平成 26 年 4 月～平成 30 年 12 月
工事	入札手続き・発注・完了	平成 26 年 4 月～平成 31 年 3 月

<実際に事業に要した事業期間>

調査設計	入札手続き・発注・完了	平成 24 年 12 月～平成 30 年 3 月
補償	完了	平成 26 年 12 月～令和 2 年 2 月
工事	入札手続き・発注・完了	平成 26 年 1 月～令和 2 年 3 月

・埋設物占有者等の関係機関協議に時間を要した結果、事業完了が遅れてしまった。

事業担当部局

上下水道部施設整備課 電話番号：022-368-1141
