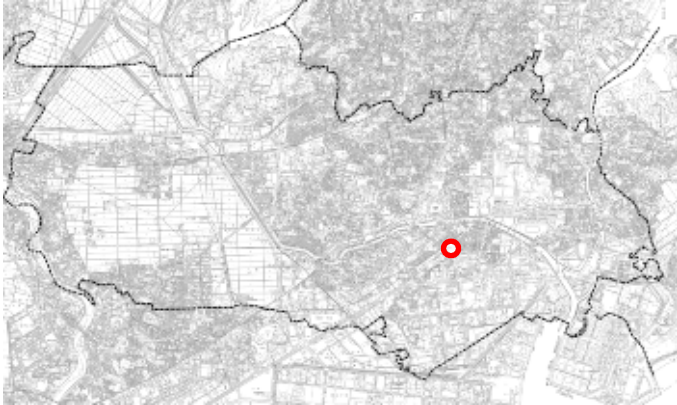


【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 ★D4-1-4 事業名 災害公営住宅（桜木）周辺施設整備事業
事業費 総額 310,046 千円 (内訳: 本工事費 310,046 千円)
事業期間 平成 25 年度～平成 26 年度
事業目的・事業地区 災害公営住宅整備事業（桜木地区）では、東日本大震災による地震・津波被害を受け、住宅を失い自力再建が困難な被災市民に対して、安心できる居住地の提供を目的としている。 本事業敷地南側に隣接し被災した保育所に関して、世代間交流を促すことで地域コミュニティの活性化を図るため、災害公営住宅と保育所を一体的に整備を行ったもの。 位置図 
事業結果 施設名：桜木保育所 1 棟 <平成 25 年度～平成 26 年度> ・本工事費 310,046 千円
事業の実績に関する評価 ①事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 ・基幹事業（D-4-1 災害公営住宅整備事業（桜木地区））により整備した災害公営住宅の入居者は高齢者が多数占めており、保育所を併設することによって、様々な場面で世代間交流が可能となったものと判断される。 ②コストに関する調査・分析・評価 ・工事費については、経済性などを総合的に判断し、設計・工事を独立行政法人都市再生機構に発注したことから、妥当な事業費であると判断できる。 ③事業手法に関する調査・分析・評価 ・本事業は、以下のとおり、概ね予定どおり事業を進めることができた。

<想定した事業期間>

工事 入札手続き・発注・完了 平成 25 年 2 月～平成 26 年 9 月

<実際に事業に要した事業期間>

工事 入札手続き・発注・完了 平成 25 年 6 月～平成 26 年 10 月

・発注準備等に時間を要したものの、その後は工事請負者と密に調整を行うことで、円滑に工事を進捗させ、ほぼ当初の予定期間どおりに工事を完了することができた。

事業担当部局

建設部都市計画課 電話番号：022-368-1141
